



Zorginstituut Nederland

Landelijk ketentestplan

iPgb release 2.3

Concept

16 september 2025

| Van goede zorg verzekerd |

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel document	3
1.3	Hulpmiddelen	3
1.4	Meer informatie	3
2	Doel, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden	4
2.1	Verantwoordelijkheden	4
2.2	Landelijke afspraken	4
2.2.1	Het Ketenbureau i-Sociaal Domein (iSD)	4
2.2.2	Ketenpartijen en/of hun softwareleveranciers	5
2.2.3	Zorginstituut Nederland	5
2.2.4	De Stuurgroep iPgb-standaard	5
2.3	Randvoorwaarden deelname landelijke ketentest	5
2.4	Testomgeving	5
2.5	Ketenpartijen betrokken bij de ketentest	6
2.6	Intake	7
3	Go-moment, implementatiedatum en escalatie	8
3.1	Go-moment en implementatiedatum	8
3.2	Escalatie	8
4	Communicatie tijdens de testperiode	9
5	Scope van de test	10
5.1	Wijzigingsverzoeken in scope voor de ketentest	10
6	Wanneer is de iPgb ketentest geslaagd	11
6.1	Welke partijen hebben getest	11
6.2	Geconstateerde bevindingen	11
7	Planning	12
7.1	Activiteiten	12
	Colofon	13

Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 1 april 2026 wordt iPgb release 2.3 geïmplementeerd. Om de ingebruikname zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kans op stagnering van de uitwisseling van de berichten te voorkomen, is het noodzakelijk om vooraf een gedegen ketentests uit te voeren.

Zorginstituut Nederland treedt hierbij vanuit haar beheerrol op als regisseur.

1.2 Doel document

Het doel van dit document is om te beschrijven wat het doel van de ketentest is en waarom deze wordt uitgevoerd. Ook worden de afspraken die met betrokken partijen zijn gemaakt over de scope, uitvoering en termijnen van de landelijke ketentest uiteengezet. Daarnaast worden de rollen en verantwoordelijkheden beschreven. Alle partijen die deelnemen aan de landelijke ketentest moeten zich houden aan de afspraken die in dit document zijn vastgelegd.

Uitgebreide informatie over alle functionele en technische wijzigingen die iPgb release 2.3 bevat is terug te vinden in het Informatiemodel iStandaarden en de onderliggende documentatie.

1.3 Hulpmiddelen

Zorginstituut Nederland stelt verschillende hulpmiddelen ter beschikking ter ondersteuning van de bouw van de nieuwe iStandaard-berichten:

- Validatiemodule en Decentrale Validatieservice: valideren van iStandaard-berichten;
- XSLT's: hulpmiddel om controleregels eenvoudig te implementeren.

1.4 Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over dit document? Neem dan contact op met:

Zorginstituut Nederland
Team Gegevensuitwisseling in de Zorg
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl

2 Doel, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden

Een landelijke ketentest voor het iPgb-berichtenverkeer heeft als doel om te controleren of ketenpartijen na implementatie van de nieuwe release op een correcte wijze berichten met elkaar kunnen uitwisselen.

In de periode voorafgaand aan de implementatie van iPgb release 2.3 vindt de landelijke ketentest plaats. Zorginstituut Nederland bewaakt de voortgang van de Ketentest en rapporteert hierover aan de Stuurgroep. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein (Ketenbureau iSD) coördineert de daadwerkelijke uitvoering van de ketentest door de ketenpartijen en rapporteert hierover aan het Zorginstituut. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wordt bij de ketentest betrokken door het Ketenbureau iSD.

Zorginstituut Nederland biedt, via dit document, een landelijk ketentestplan aan waarin beschreven staat welke wijzigingsverzoeken in de ketentest getest moeten worden. Ook beschrijft dit document aan welke voorwaarden de ketenpartijen moeten voldoen. Partijen die deelnemen aan de landelijke ketentest houden zich aan de afspraken die in dit landelijk ketentestplan zijn vastgelegd.

2.1 Verantwoordelijkheden

Om ervoor te zorgen dat de ketentest iPgb succesvol verloopt hebben de partijen die deelnemen een aantal verantwoordelijkheden.

- Alle ketenpartijen en hun softwareleveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor het opleveren van geteste software waarmee correcte iPgb release 2.3 berichten kunnen worden uitgewisseld.
- Ketenpartijen en hun softwareleveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor maken van afspraken met een testpartner.
- Zorginstituut Nederland gaat ervan uit dat ketenpartijen zelf een reële planning hanteren bij de testen. Oftewel, de planning is dusdanig dat het zeker is dat de testwerkzaamheden op de uiterste datum gereed zijn. In hoofdstuk 7 is op hoofdlijnen vermeld welke acties in welke periode dienen plaats te vinden zodat partijen hier met hun interne planning rekening mee kunnen houden.

2.2 Landelijke afspraken

Bij het opstellen van dit landelijke ketentestplan zijn afspraken gemaakt met ketenpartijen en softwareleveranciers over de uitvoering van de ketentests. Deelnemende partijen houden zich aan deze afspraken.

2.2.1 Het Ketenbureau i-Sociaal Domein (iSD)

- Het Ketenbureau iSD coördineert, via de 'Testers voor Testers' groep, de testen op de Ketentestomgeving in de iPgb-keten en faciliteert de samenwerking tussen de testende partijen voor de iPgb ketentest;
 - in de 'Testers voor Testers' groep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Bureau InformatieDiensten Nederland (BIDN), SVB, VECOZO, VNG, VWS, ZN;
- het Ketenbureau iSD informeert het Zorginstituut wekelijks over de voortgang.
- het Ketenbureau iSD spreekt deelnemende partijen aan bij het niet naleven van de in dit ketentestplan genoemde termijnen en afspraken;
- het Ketenbureau iSD informeert alle deelnemende partijen tweewekelijks over de voortgang van de landelijke ketentest;

2.2.2 Ketenpartijen en/of hun softwareleveranciers

- VWS zorgt dat een iPgb release 2.3 testomgeving beschikbaar is;
- VECOZO en BIDN zorgen voor beschikbaarheid van een iPgb release 2.3 testomgeving en zorgen ervoor dat deze gekoppeld is aan de testomgeving van VWS;
- VWS, VECOZO, BIDN hebben een geslaagde integratietest uitgevoerd voordat de daadwerkelijke ketentestperiode start;
- de integratietest vindt plaats vanaf 1 november 2025;
- de daadwerkelijk ketentestperiode vindt plaats vanaf 2 januari 2026;
- ketenpartijen en/of hun softwareleveranciers voldoen aan de in dit landelijk ketentestplan genoemde randvoorwaarden voor deelname aan de ketentests;
- ketenpartijen en/of hun softwareleveranciers voeren minimaal alle testen uit die de 'Testers voor Testers' groep, onder de regie van het Ketenbureau iSD, zijn afgesproken.
 - Indien partijen onderling overeenkomen om meer testscenario's uit te voeren valt dit buiten de scope van dit testplan (en de escalatieprocedure);
- ketenpartijen en/of hun softwareleveranciers melden blokkerende bevindingen en bevindingen die een ernstige verstoring kunnen opleveren in de gegevensuitwisseling zo snel mogelijk na constatering, maar uiterlijk 18 februari 2026, bij het Ketenbureau iSD;
- eventuele bevindingen zijn opgelost of er zijn maatregelen genomen waardoor geen enkele partij hinder ondervindt van bevindingen op uiterlijk 27 februari 2026.

2.2.3 Zorginstituut Nederland

- Zorginstituut Nederland stelt het landelijk ketentestplan op;
- Zorginstituut Nederland biedt een Validatiemodule en een Decentrale Validatieservice aan waarmee softwareleveranciers iPgb release 2.3 berichten kunnen valideren;
- Zorginstituut Nederland informeert de Stuurgroep iPgb-standaard over de voortgang van de landelijke ketentest.

2.2.4 De Stuurgroep iPgb-standaard

- De Stuurgroep iPgb-standaard bespreekt op 2 maart 2026 (circa één maand voor de implementatie van iPgb release 2.3) de testresultaten en de positieve/negatieve consequenties van deze resultaten.

2.3 Randvoorwaarden deelname landelijke ketentest

Op het moment dat een ketenpartij een ketentest start met een andere ketenpartij, moet voldaan zijn aan de volgende randvoorwaarden:

- de eigen software is gereed, is volledig getest en voldoet aan iPgb release 2.3;
- er is een gedegen regressietest op de eigen software uitgevoerd met positief resultaat;
- er zijn onderlinge afspraken gemaakt over het aanbieden van testberichten, voordat deze worden verzonden naar de andere ketenpartij.

2.4 Testomgeving

VWS zorgt ervoor dat uiterlijk 2 januari 2026 een testomgeving beschikbaar is voor de ketentest en communiceert de (technische) kenmerken van deze omgeving aan BIDN en VECOZO. BIDN en VECOZO koppelen hun testomgeving aan de testomgeving van VWS.


Alle partijen moeten verplicht gebruik maken van de testomgeving van BIDN of VECOZO. Het is de verantwoordelijkheid van (de softwareleverancier van) een ketenpartij om de technische verbinding met deze testomgeving te maken.

2.5 Ketenpartijen betrokken bij de ketentest

De volgende partijen zijn betrokken bij het beschikbaar stellen van de PGB-infrastructuur en de uitvoering van de ketentest:

Partij	Rol	Taak ketentest iPgb
Zorginstituut Nederland	Beheerder iPgb-standaard	Regisseur ketentest iPgb release 2.3
Ketenbureau i-Sociaal Domein	Ketenregisseur voor de iSD-keten.	Coördinator ketentest iPgb release 2.3
VWS	Beheerder PGB2.0 portaal	Stelt een testomgeving beschikbaar. Testen iPgb release 2.3
SVB	Gebruiker PGB2.0 portaal	Testen iPgb release 2.3
Zorgkantoren	Gebruiker PGB2.0 portaal	Testen iPgb release 2.3
Gemeenten	Gebruiker PGB2.0 portaal	Testen iPgb release 2.3
VECOZO	Koppelpunt voor uitwisseling berichten tussen zorgkantoren en PGB2.0 portaal	Stelt testomgeving voor iPgb release 2.3 beschikbaar voor Langdurige zorg keten
BIDN	Koppelpunt voor uitwisseling berichten tussen gemeenten en PGB2.0 portaal	Stelt testomgeving iPgb release 2.3 beschikbaar voor iSD-keten
Softwareleverancier zorgkantoor	Softwareleverancier zorgkantoor	Aansluiten op testomgeving VECOZO Testen iPgb release 2.3
Softwareleverancier gemeente	Softwareleverancier zorgkantoor	Aansluiten op testomgeving BIDN Testen iPgb release 2.3

Onderstaande afbeelding toont alle partijen in de iPgb-keten samen met de berichten die tussen deze partijen worden uitgewisseld.

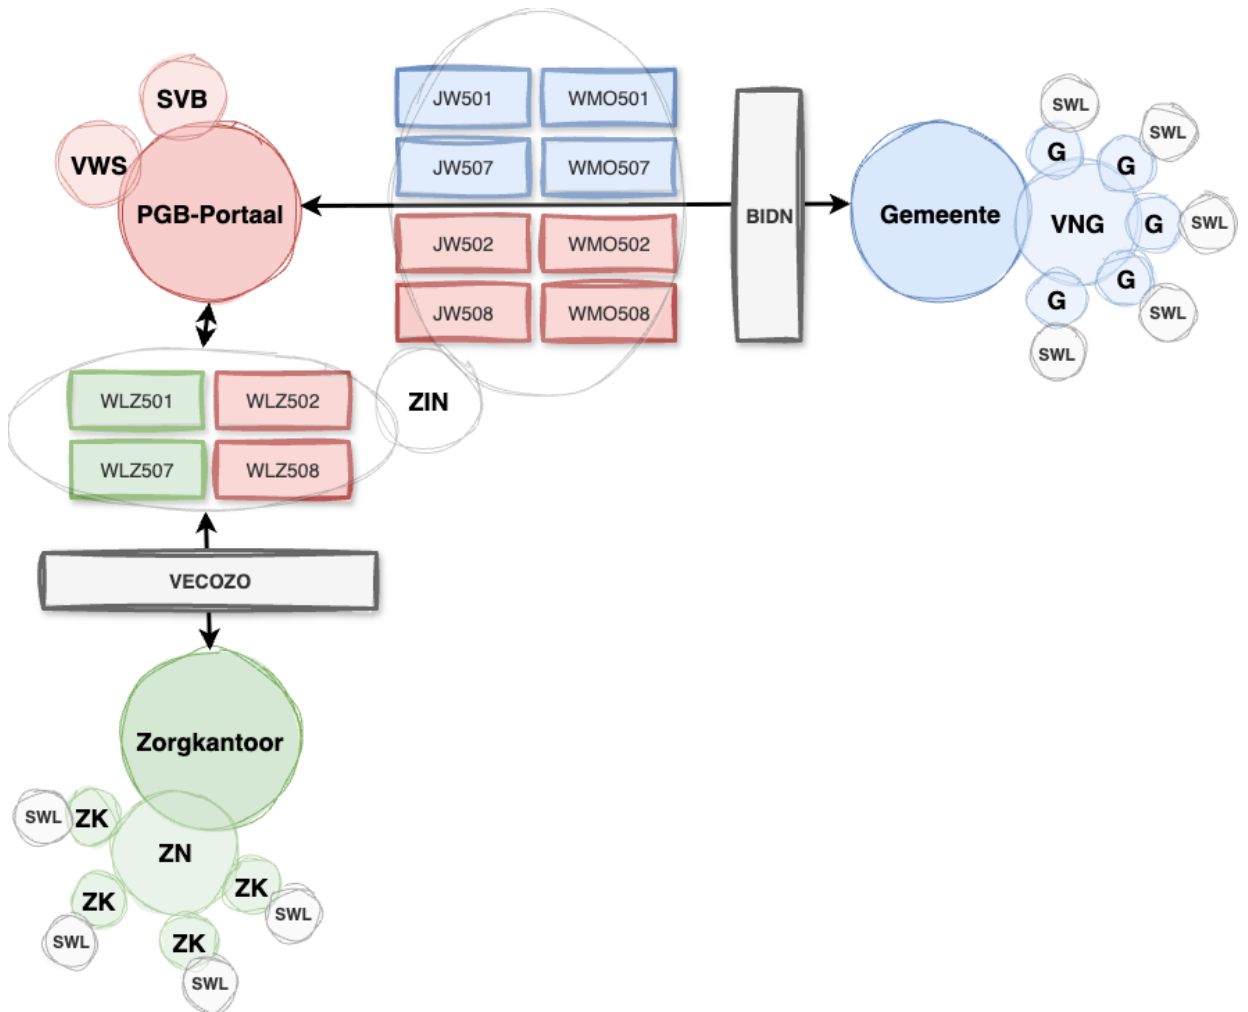

2.6 Intake

Het Ketenbureau iSD zal in overleg met de 'Testers voor Testers' groep voorafgaand aan de ketentest een intake uitvoeren met de softwareleveranciers van gemeenten en zorgkantoren, een test coördinator van VWS en SVB, BIDN en VECOZO.

Tijdens deze intake wordt ter voorbereiding op de ketentest een aantal zaken afgestemd:

- vaststellen testmomenten;
- uitwisselen contactgegevens;
- wijze van communicatie testcases;
- beschikbaarheid partijen;
- aansluiting softwareleveranciers op testomgeving BIDN/VECOZO;
- afspraken over vulling testbestanden met dummy-data.

De intake gesprekken vinden plaats vanaf medio oktober 2025.

3 Go-moment, implementatiedatum en escalatie

3.1 Go-moment en implementatiedatum

Op 1 april 2026 wordt de iPgb release 2.3 in gebruik genomen. In uitzonderlijke situaties kan de implementatie van deze release uitgesteld worden. Dat is van toepassing als, door een ernstige verstoring van (delen van) de keten, de continuïteit van het pgb ketenproces in gevaar komt. De Stuurgroep iPgb-standaard zal tijdens het Go-moment de haalbaarheid van de implementatiedatum bepalen.

3.2 Escalatie

Op het moment dat een ketenpartij de verschillende testscenario's niet binnen het aangegeven tijdsframe kan afronden, meldt de betreffende ketenpartij dit direct aan het Ketenbureau iSD. In dat geval zoekt het Ketenbureau iSD, samen met de betrokken partij, naar een oplossing. Hierbij is het uitgangspunt dat de veroorzaker het probleem oplost. Indien er tussentijds geen oplossing wordt gevonden zal het Ketenbureau iSD, Zorginstituut Nederland informeren. In overleg wordt bepaald of het probleem, en de eventuele consequenties daarvan, naar de Stuurgroep iPgb-standaard geëscaleerd moet worden. Door de Stuurgroep iPgb-standaard zal vervolgens worden bepaald wat de vervolgstappen zijn.

4 Communicatie tijdens de testperiode

Medio oktober 2025 publiceert Zorginstituut Nederland het Landelijk ketentestplan iPgb release 2.3 op iStandaarden.nl. Ketenpartijen en softwareleveranciers worden hierover geïnformeerd. Daarnaast wordt door middel van een artikel in de Nieuwsbrief iStandaarden of door middel van een Nieuwsflits de aandacht gevestigd op het verschijnen van het ketentestplan.

Gedurende de ketentest informeert het Ketenbureau iSD Zorginstituut Nederland over de voortgang van de ketentest. Zorginstituut Nederland informeert vervolgens alle deelnemende partijen over de voortgang van de ketentest. Betrokken partijen worden per e-mail geïnformeerd.

Zorginstituut Nederland informeert de Stuurgroep iPgb-standaard over de voortgang van de ketentest. Dit gebeurt door middel van schriftelijke rapportage een week voorafgaand aan de bijeenkomst van de Stuurgroep iPgb-standaard en een mondelinge toelichting daarvan tijdens de bijeenkomst. De bijeenkomst van de Stuurgroep iPgb-standaard vindt plaats op 2 maart 2026. Indien nodig zal Zorginstituut Nederland de Stuurgroep iPgb-standaard ook tussentijds op de hoogste stellen wanneer de resultaten van de ketentest daar aanleiding toegeven.

5 Scope van de test

5.1 Wijzigingsverzoeken in scope voor de ketentest

In onderstaand overzicht zijn de wijzigingsverzoeken opgenomen die deel uitmaken van de iPgb release 2.3 release. Tijdens de referentiegroepen is door de betrokken partijen per wijzigingsverzoek vastgesteld of deze in scope moet zijn van de ketentest. De 'Testers voor Testers' groep zal voor deze wijzigingsverzoeken testscenario's opstellen die worden uitgevoerd tijdens de ketentest.

RFC	Titel	In scope
RFC 2402	Corrigeren classificatie bestaande regels	Nee
RFC 2403	Beperkte overlap van zorgfuncties binnen bericht valideren	Ja
RFC 2404	Regels opnemen aangaande berichtformaat	Nee
RFC 2406	Afdwingen dat naast Zorgfunctie 99 er geen andere Zorgfuncties meer in een bericht aanwezig mogen zijn	Ja
RFC 2412	OP530 termijn melden bestedingsconflict aanpassen van een week naar een dag	Nee
RFC 2417	Informatiemodel en XSD's in lijn brengen	Nee
RFC 2419	Vertegenwoordiger is hetzij natuurlijk persoon, hetzij organisatie	Ja
RFC 2421	Duidelijke casuïstiek over vegen bij het gebruik van (meerdere) zorgfuncties toevoegen	Nee
RFC 2422	Na BAB bestedingsconflict ook nog BAB na einde budget	Nee
RFC 2429	Periodes van functiebudgetten moeten binnen totale periode van het budget liggen	Ja
RFC 2431	Toevoegen van de nieuwe typen vertegenwoordigers	Ja
RFC 2435	Codelijst zorgfuncties in lijn brengen met zorgfuncties die ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden	Ja
RFC 2436	LDT_Versie toevoegen aan basisschema.xsd	Nee
RFC 2442	Wegnemen hergebruik retourcodes	Ja
RFC 2445	Verwijderen elementen uit entiteit Relatie (optimalisatie en dataminimalisatie)	Ja
RFC 2446	Mogelijk maken om meerdere Correspondentieadressen mee te geven in de TKB	Ja
RFC 2449	Verduidelijken TR562: een reeds gewijzigd budget mag niet vaker met zelfde BudgetIdentificatie gewijzigd aangeleverd worden	Ja
RFC 2450	Budgetperiodes binnen één wet mogen elkaar niet overlappen, ook niet wanneer meerdere verstrekkers spelen	Nee
RFC 2458	Verwijderen elementen uit entiteit Contact (optimalisatie en dataminimalisatie)	Ja
RFC 2459	Regels opnemen aangaande het gebruik van retourberichten	Nee
RFC 2460	Duidelijke casuïstiek toevoegen voor het vegen van zorgfuncties die niet meer in het bericht aanwezig zijn	Nee
RFC 2502	Mogelijk maken om communicatie voorkeuren van budgethouder en vertegenwoordigers te beheren	Ja
RFC 2503	Algemeen onderhoud	Ja

6 Wanneer is de iPgb ketentest geslaagd

6.1 Welke partijen hebben getest

Alle berichtstromen moeten door de ketenpartijen getest zijn:

- De (softwareleveranciers van de) zorgkantoren hebben tests uitgevoerd met de SVB via VECOZO.
- De softwareleveranciers van de gemeenten hebben tests uitgevoerd met de SVB via het BIDN.
- De SVB heeft tests uitgevoerd met (de softwareleveranciers van) de zorgkantoren en de softwareleveranciers van de gemeenten.

6.2 Geconstateerde bevindingen

Alle vooraf afgesproken testscenario's moeten succesvol doorlopen zijn:

- als er bevindingen zijn geconstateerd dan:
 - zijn deze verholpen;
 - of deze zijn nog niet verholpen maar geaccepteerd door de ketenpartijen;
 - of er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat andere ketenpartijen hinder ondervinden van deze bevinding.

7 Planning

7.1 Activiteiten

In onderstaande tabel staan de activiteiten per ketenpartijen / softwareleveranciers.

Omschrijving	Wanneer (datum)	Wanneer (tijd)	Actiehouders
Intakes	Vanaf half oktober 2025	In overleg	Ketenbureau iSD, softwareleveranciers, VWS, BIDN, VECOZO, SVB
Testomgeving VECOZO inclusief integratietest gereed	3 nov 2025	17.00 uur	VECOZO, in samenwerking met VWS
Testomgeving BIDN inclusief integratietest gereed	3 nov 2025	17.00 uur	BIDN, Ketenbureau iSD, in samenwerking met VWS
Testomgeving VWS gereed	2 jan 2026	09.00 uur	VWS, Ketenbureau en BIDN, VECOZO in samenwerking met VWS
Start ketentest iPgb release 2.3	2 jan 2026	Vanaf 09.00 uur	Alle betrokken partijen
Alle ketentests zijn afgerond en eventuele issues zijn door de ketenpartijen aan Ketenbureau iSD en Zorginstituut Nederland gemeld	18 feb 2026	17.00 uur	Alle partijen
Geconstateerde bevindingen zijn opgelost	27 feb 2026	12.00 uur	Alle softwareleveranciers
Go-moment iPgb release 2.3	2 mrt 2026	15.00 uur	Stuurgroep iPgb
Communicatie over GO-moment.	mrt 2026	Ntb	Zorginstituut Nederland

Colofon

Versienummer 0.9
Volgnummer 2025015001
Contactpersoon Judith Verhoeven
+31628314012

Afdeling Fondsen & Informatiemanagement
Team Gegevensuitwisseling in de Zorg

Uitgebracht aan Ketenbureau iSD, pgb ketenpartijen en
softwareleveranciers in de pgb-keten
